

令和5年度電源立地地域対策補助金事業評価報告書

地 第 336 号
令和6年3月28日

鹿児島県知事 塩田 康一 殿

住所 鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番 1 号
氏名 霧島市長 中重 真一

令和 5 年 6 月 30 日付け地政第394号の交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策補助金にかかる補助事業の成果の評価について、鹿児島県電源立地地域対策補助金交付要綱第 1 1 条第 3 項の規定により、別紙のとおり報告します。

記

I 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	補助事業の名称	補助事業者名又は間接補助事業者名	補助事業に要した費用	補助金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道東川原線道路維持事業	霧島市	19,668,000	11,693,000	

(備考) 事業が 2 つ以上の場合は必要に応じ欄をもうけること。


II 事業評価個表

番号	措置名	補助金事業名
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道東川原線道路維持事業
補助事業者名又は間接補助事業者名		霧島市
補助事業実施場所	鹿児島県霧島市隼人町住吉 地内	
補助事業の概要	市道東川原線は、2級河川天降川の堤防道路であり、地域住民のほか、耕作者や周辺事業者等も日常的に利用しています。周辺には工場が立地されており、大型車の往来も多い状況の中、当該路線は、堤防道路にアスファルト舗装を施工した簡易的な舗装です。このようなことを背景に、路面の損傷やわだち掘れによる水たまりやポットホールが繰り返し発生しています。本事業の実施により道路の利用状況を考慮した舗装構成を行い、周辺環境の改善及び道路の安全かつ円滑な交通環境の確保が図られました。 施工延長L=273m 土工一式 A s 舗装工A = 1,456㎡	
補助事業に関する主要政策・施策と目標	第二次霧島市総合計画（平成30年度～令和9年度） 政策2 くらし みどりあふれる快適で暮らしたいまちづくり 施策3 快適生活の基盤づくりの推進 2. 道路ネットワークの構築と道路施設の維持（目標） ・幹線道路のバイパス整備や地域の拠点施設を結ぶアクセス道路等の整備を推進し、道路ネットワークの構築を図る。 （成果指標） ・市道の改良率 現状値：48.3%（令和3年度） 目標値：48.9%（令和9年度）	

事業開始年度	令和5年度		事業終了（予定）年度		令和5年度	
事業期間の設定理由	－					
補助事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和9年度	
	市道の改良率	48.90%	成果実績	%		
			目標値	%	48.9	
			達成度	%		
	評価年度の設定理由					
	第二次霧島市総合計画は、後期基本計画の計画期間がR5～R9となっているため。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	道路舗装工事を行ったことにより、安心・安全な交通、及び周辺地域環境の確保を図ることができました。成果目標に設定している「市道の改良率」については、令和9年度に達成度合いを測定する予定です。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無						
補助事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度	令和4年度 令和5年度
	施工延長		活動実績	－	－	273
			活動見込	m	－	273
			達成度	%	－	100
補助事業の総事業費等	令和3年度	令和4年度		令和5年度	備考	
総事業費	0	0		19,668,000		
補助金充当額	0	0		11,693,000		
うち文部科学省分	0	0		0		
うち経済産業省分	0	0		11,693,000		
補助事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
道路維持工事		条件付一般競争入札		株式会社 末広（霧島市）		19,668,000
補助事業の担当課室	霧島市建設部建設施設管理課					
補助事業の評価課室	霧島市企画部地域政策課					

鹿児島県
霧島市全図

R5 市道 東川原線(交付金)道路維持工事
施工延長 L=273m
土工 一式,
AS舗装工 A=1456m2

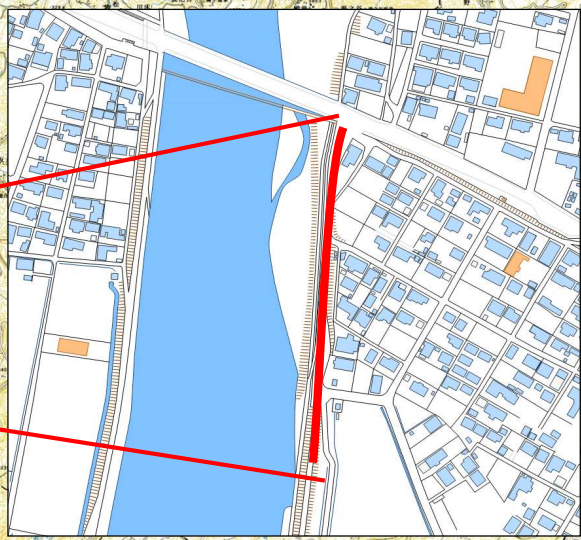

市道 東川原線
令和5年度 L=273m

記号	説明	備考
1	国道路	
2	県道路	
3	市道	
4	町道	
5	村道	
6	河川	
7	海岸線	
8	境界線	
9	等高線	
10	標高	
11	方位	
12	縮尺	
13	印刷	
14	発行	
15	更新	
16	備考	



1:50,000

 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 No.0+18~3 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 0+18~No. 3
 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 No.3~5 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 No. 3~5
 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 No.5~7 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 No. 5~7

 工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事 工 種 測 点 完成 No.0+18～3 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 完成 No. 0+18～3
 工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事 工 種 測 点 完成 No.3～5 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 完成 No. 3～5
 工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事 工 種 測 点 完成 No.5～7 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 完成 No. 5～7

 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 No.7～9 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真
 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 No.9～11 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真
 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 No.11～13 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 着工前 No. 7～9

写真タイトル 着工前 No. 9～11

写真タイトル 着工前 No. 11～14+9

 工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事 <table border="1"> <tr> <td>工 種</td> <td>測 点</td> </tr> </table> 完成 No.7～9 株式会社末広	工 種	測 点	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 完成 No. 7～9
工 種	測 点		
 工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事 <table border="1"> <tr> <td>工 種</td> <td>測 点</td> </tr> </table> 完成 No.9～11 株式会社末広	工 種	測 点	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 完成 No. 9～11
工 種	測 点		
 工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事 <table border="1"> <tr> <td>工 種</td> <td>測 点</td> </tr> </table> 完成 No.11～13 株式会社末広	工 種	測 点	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 完成No. 11～13
工 種	測 点		

 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 No.13～11 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 No. 13～
 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 No.11～9 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 No. 11～9
 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 No.9～7 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 No. 9～7



工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事
 工 種 測 点
 完成
 No.14+11～
 株式会社来広

写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 完成 No. 14+11～



工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事
 工 種 測 点
 完成
 No.11～9
 株式会社来広

写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 完成 No. 11～9



工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事
 工 種 測 点
 完成
 No.9～7
 株式会社来広

写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 完成 No. 9～7

 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 No.7~5 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 No. 7~5
 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 No.5~3 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 No. 5~3
 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 No.3~0+18 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 No. 3~0+18



工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事
工 種 測 点
完成
No.7～5
株式会社末広

写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 完成 No. 7～5



工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事
工 種 測 点
完成
No.5～3
株式会社末広

写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 完成 No. 5～3



工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事
工 種 測 点
完成
No.3～0+11
株式会社末広

写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 完成 No. 3～0+18

 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 1号取付道路 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 1号取付道路
 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 1号取付道路 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 1号取付道路
 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 2号取付道路 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 2号取付道路



工事名	R5東川線(交付金)道路舗装工事	
工 種	測 点	
完成 1号取付道路		
株式会社末広		

写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 完成 1号取付道路



工事名	R5東川線(交付金)道路舗装工事	
工 種	測 点	
完成 1号取付道路		
株式会社末広		

写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 完成 1号取付道路



工事名	R5東川線(交付金)道路舗装工事	
工 種	測 点	
完成 2号取付道路		
株式会社末広		

写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 完成 2号取付道路

 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 2号取付道路 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 2号取付道路
 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 3号取付道路 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 3号取付道路
 工事件名 R5東川原線(交付金)道路整備工事 工事場所 着工前 3号取付道路 株式会社東広	写真区分 着手前及び完成写真 写真タイトル 着工前 3号取付道路



工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事	
工 種	測 点
完成 2号取付道路	
株式会社末広	

写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 完成 2号取付道路



工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事	
工 種	測 点
完成 3号取付道路	
株式会社末広	

写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 完成



工事名 R5東川線(交付金)道路舗装工事	
工 種	測 点
完成 3号取付道路	
株式会社末広	

写真区分 着手前及び完成写真

写真タイトル 完成
