

別紙

I. 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	市道 田方見次線 道路維持工事	霧島市	15,000,000	13,500,000	市総事業費 15,000,000円

(備考) 事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道 田方見次線 道路維持工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		霧島市			
交付金事業実施場所		霧島市 隼人町見次 地内			
交付金事業の概要		<p>本市では、「霧島市総合計画」に基づき、交通体系の充実による道路ネットワークの構築及び道路施設の保全に取り組んでおり、歩行者や通行車両の安全性確保並びに利便性の向上を図るために、道路改良工事を行います。</p> <p><道路改良></p> <p>施工延長 L=216m、平均幅員 W=4.0m、アスファルト舗装工 A=818m²、路上路盤再生工 A=818m²、排水構造物工 L=81m</p>			
総事業費		交付金充当額		13,500,000	
		うち文部科学省分		0	
		うち経済産業省分		13,500,000	
交付金事業の成果目標		増加傾向にある路面劣化などに対応し、本整備をはじめとした道路整備を計画的に進めていくことで、地域住民の福祉の向上を図ります。			
交付金事業の成果指標		市道田方見次線の改良率（規格改良率／実延長）：平成28年度末8.8%→平成29年度末21.3%			
交付金事業の成果及び評価		市道田方見次線の改良率について、本年度の事業実施（L=216m）により21.3%となりました。本事業により道路の舗装状況が改善されたことで、通行する車両や歩行者の安全性が確保されるとともに、周辺地域の利便性向上に繋がり、あわせて道路維持に係る負担の軽減も図られ、地域住民の福祉の向上が図られました。			
		契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
		工事請負	条件付一般競争入札	淵脇建設(株)	15,000,000
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無					
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度				該当無し	

-
- (備考) (1) 事業ごとに作成すること。
- (2) 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
- (3) 交付金事業の成果目標の欄は、発電用施設周辺地域整備法第1条に規定する同法の目的の趣旨を踏まえて具体的に記載すること。
- (4) 交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。
- (5) 交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
- (6) 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。
- (7) 成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員等を記載すること。

工事
着手前及び完成写真
着工前
No. 43～No. 45



工事
着手前及び完成写真
着工前
No. 45～No. 47



工事
着手前及び完成写真
着工前
No. 47～No. 49





工事
着手前及び完成写真
完成
No. 43~No. 45



工事
着手前及び完成写真
完成
No. 45~No. 47



工事
着手前及び完成写真
完成
No. 47~No. 49

工事
 着手前及び完成写真
 着工前
 No. 49~No. 51



工事
 着手前及び完成写真
 着工前
 No. 51~No. 53



工事
 着手前及び完成写真
 着工前
 No. 53~No. 53+16.8





工事
 着手前及び完成写真
 完成
 No. 49~No. 51




工事
 着手前及び完成写真
 完成
 No. 51~No. 53



工事
 着手前及び完成写真
 完成
 No. 53~No. 53+16.8

工事
着手前及び完成写真
着工前
No. 53+16.8~No. 53

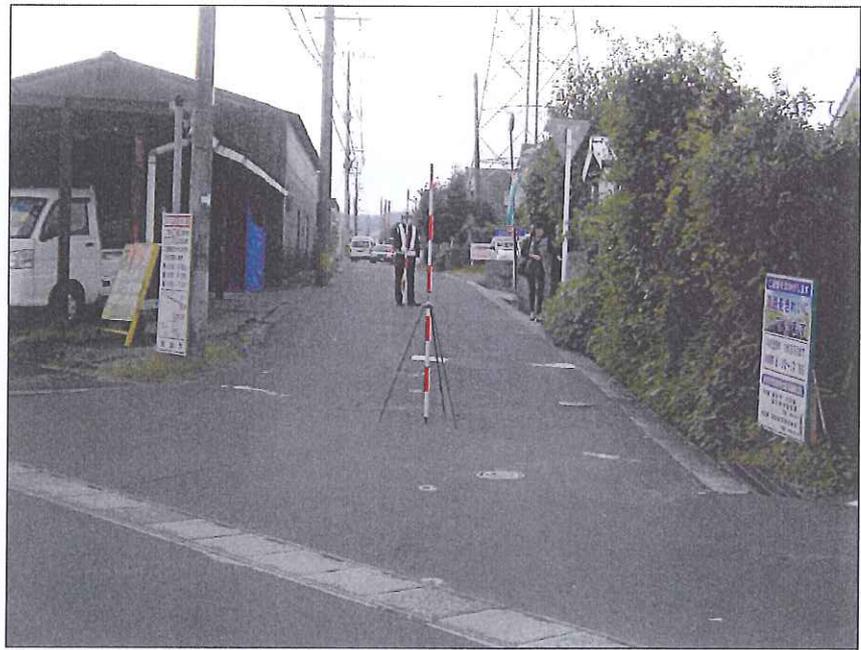



工事
着手前及び完成写真
完成
No. 53+16.8~No. 53
